

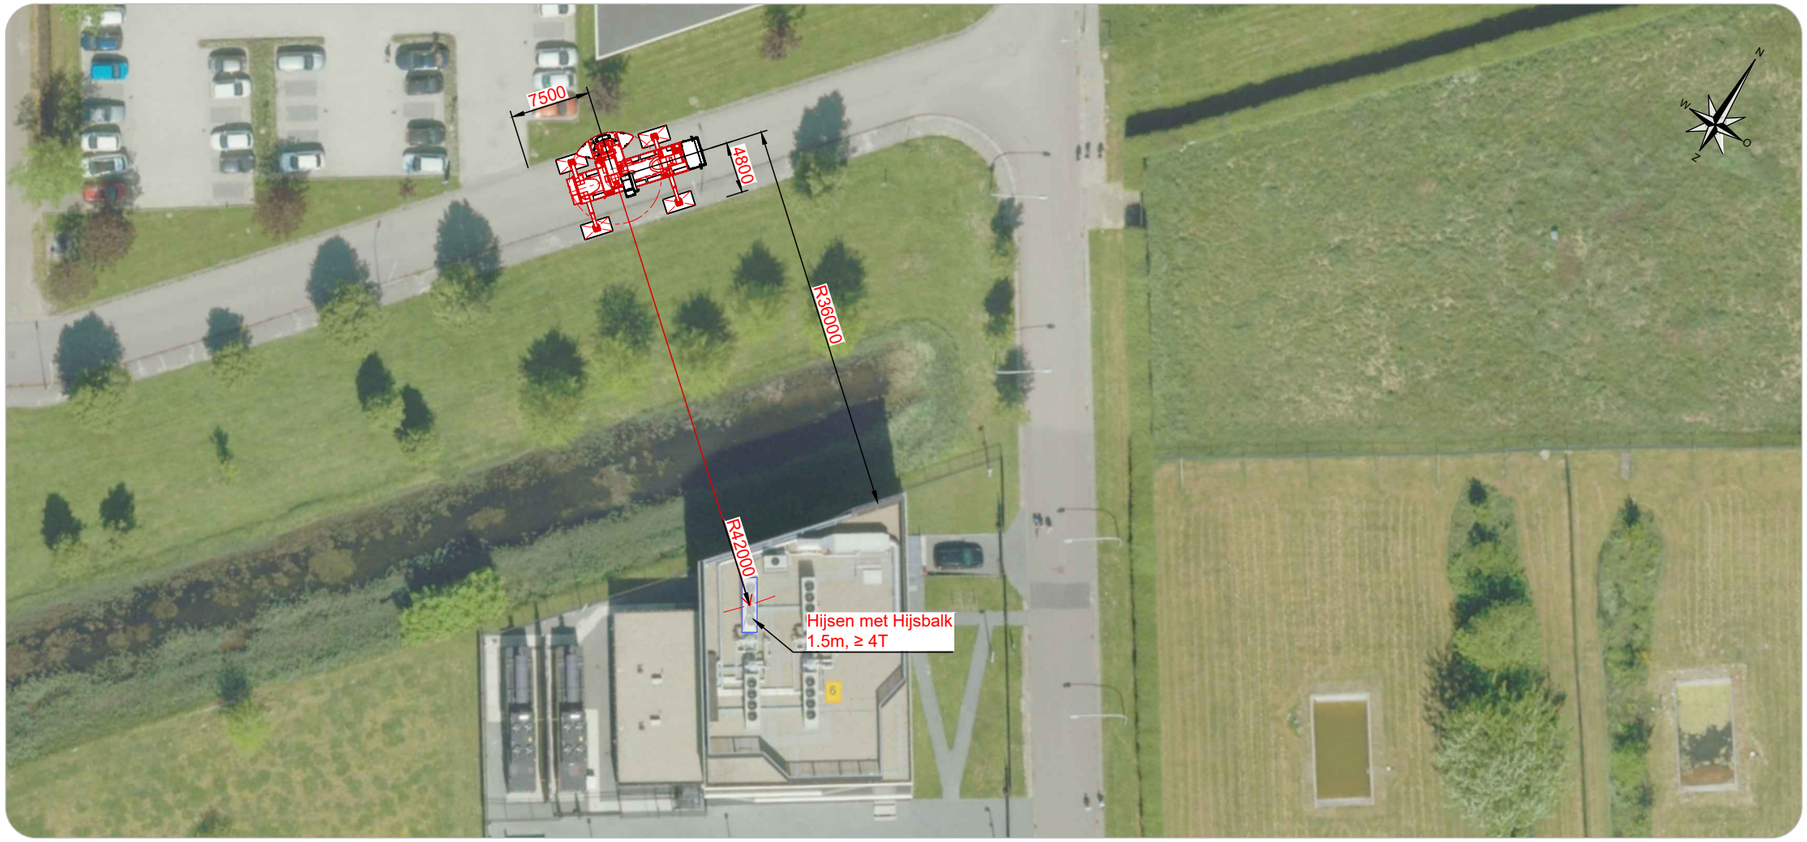



LIEBHERR LTM1150-5.3	Sit R42.0 m	
HOOFDMAST	49.4	m
STEMPELBREEDTE	6.5	m
BALLAST	45.0	T
RADIUS	42.0	m
CAPACITEIT	5.0	T
MAX. LAST	3.5	T
BLOKGEWICHT	0.3	T
HIJSGEREEDSCHAPPEN	0.1	T
TOTAAL	3.9	T
PERCENTAGE VAN CAPACITEIT	78.0	%

MAXIMALE GRONDDRUK

	STEMPEL KRACHT		OPPERVLAK SCHOT		GRONDDRUK	
A	59.0	T	3.9	m²	15.1	T/m²
B	56.0	T	3.9	m²	14.4	T/m²
C	46.0	T	3.9	m²	11.8	T/m²
D	32.0	T	3.9	m²	8.2	T/m²



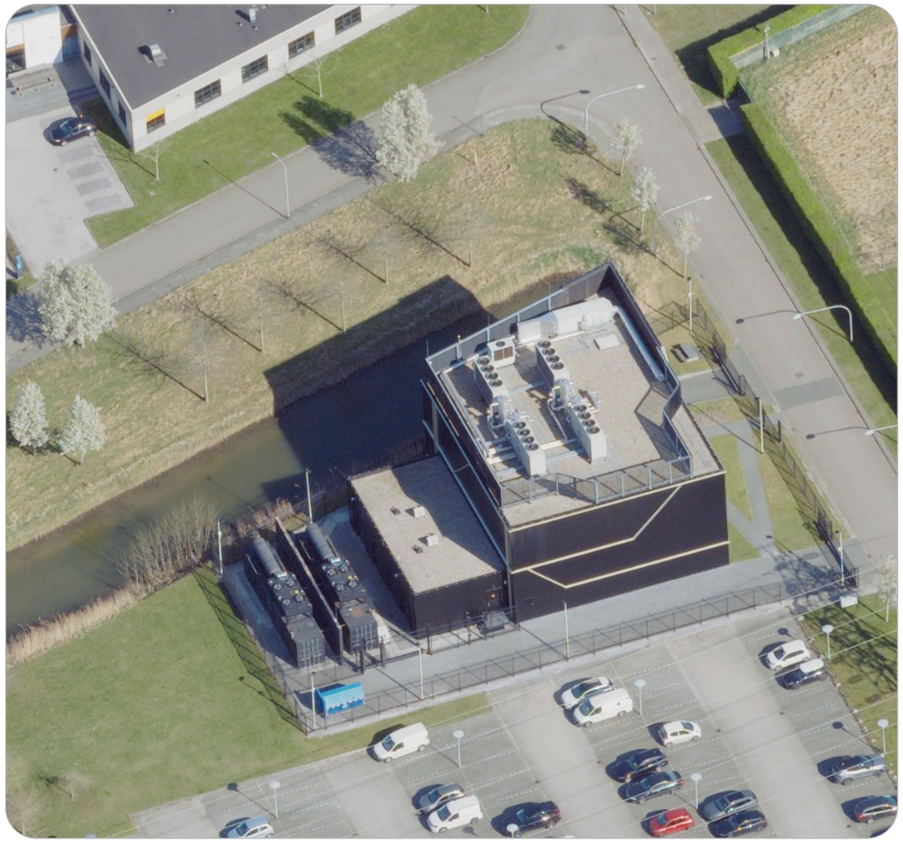

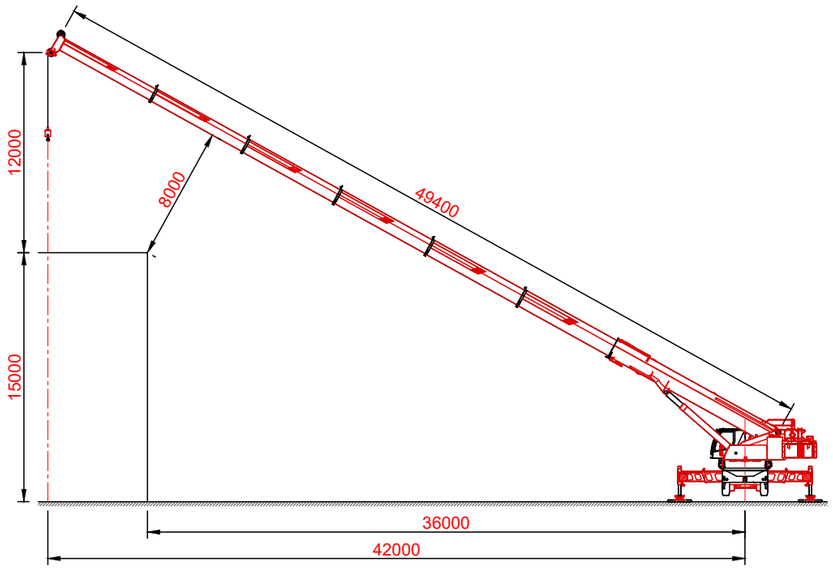

Opmerkingen:

- Geen informatie over de last beschikbaar (afmetingen, zwaartepuntspositie, hijspunten,etc.). Derhalve aangenomen zoals getoond;
- Klant verantwoordelijk voor het opleveren van een vlakke en verdichte ondergrond, welke de optredende gronddrukken kan opnemen;
- Plan gebaseerd op geconverteerde en verschaalde originelen. Conversie kan leiden tot afwijkingen;
- Een deskundige Wagenborg medewerker mag besluiten om waar nodig af te wijken van het plan en beperkt aanpassingen door voeren.

REV:	DESCRIPTION:	DATE:	DRAWN:	CHECKED:	APPROVED:
-	First issue	03-06-2025	WVS		RKA

CLIENT: *Equans B.V.*

PROJECT: *Airco Unit Grouwelerie Groningen*

TITLE: *Maximaal 3.5 Ton*

ROYAL WAGENBORG

Wagenborg Nedlift B.V.
Gideonweg 5
9723 BM Groningen
+31 (0)50 36 82 800
WWW.WAGENBORG.COM

THIS PUBLICATION REMAINS THE PROPERTY OF THE PUBLISHER AND SHALL BE TREATED AS CONFIDENTIAL UNLESS CONTRACTUALLY SPECIFIED OTHERWISE. NO PART OF IT MAY BE REPRODUCED, STORED IN A RETRIEVAL SYSTEM OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.

SIZE:	SCALE:	PROJECT NO:	DRAWING NO:	SHEET:
A3	-		035559-000-01	1/1
