


= Kraan opstelling voor de woning op de openbare weg. Stempelschotten worden ingezet voor behoud van het wegdek en stoep. Tussen 07:00 en 16:00 staan we op twee momenten 1 uur in de straat voor werkzaamheden. Omwonenden worden vooraf ingelicht over de werkzaamheden en verzocht straat en betreffende parkeervakken vrij te houden om hinder te beperken.

= Directe omgeving kraan wordt afgezet met bebording om werkzaamheden kenbaar te maken en veiligheid te waarborgen. Gedurende het hijsen wordt er op toegezien dat voorbijgangers zich niet onder de hijslast begeven.

= Bebording wordt geplaatst om tijdelijke afsluiting kenbaar te maken.

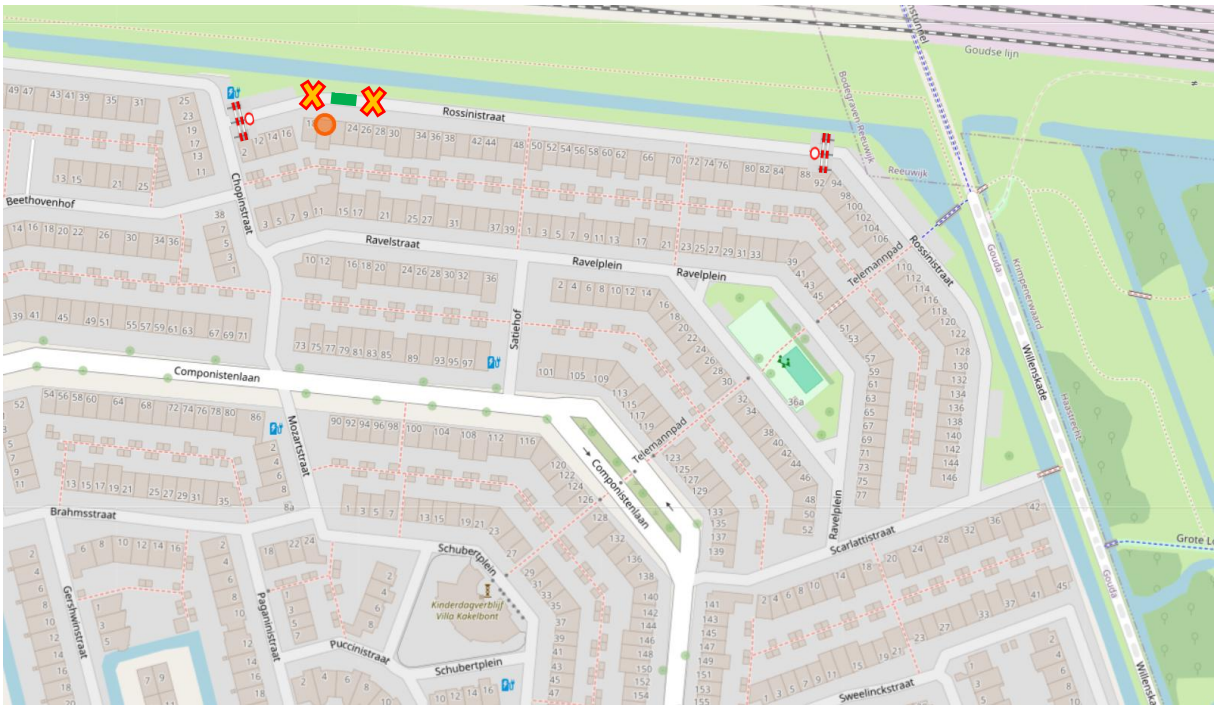

= voorbeelden van opstelling van kraan in straat en bebording.

