Verkeersplan Grote Woerdlaan

ROK baggeren & reinigen Duikers



GROWEPA
AANNEMINGSBEDRIJF

Verkeersplan Grote Woerdlaan

Opdrachtgever	Hoogheemraadschap van Delfland
Document naam	Verkeersplan Grote Woerdlaan
Bestek	ROK Baggeren Watergangen & Reinigen Duikers 2023-2031
Besteknummer	2023-001 d.d.
Versie	02
Datum opgesteld	19-12-2025

Revisie nr.	Status	Opgesteld	Controle	Goedgekeurd	Goedkeuring directie UAV
01	Definitief	G. Keuken	M. van Vliet		

Revisieoverzicht		
Revisie	datum	Aanpassingen
01	19-12-2025	Eerste versie definitief
02	19-06-2026	Uitvoeringsdatum bekend

Inhoud

1. Inleiding 4
2. Locatie van de werkzaamheden en algemene gegevens 5
2.1 Algemeen 5
2.2 Locatie van de werkzaamheden 5
2.3 Uitvoeringswijze 5
2.4 Uitvoeringsgegevens 6
3. Verkeersmaatregelen gemeente Westland 7
3.1 Maatregel 7
3.2 Tekeningen 7

1. Inleiding

Om de werkzaamheden voor de weggebruikers en voor de werknemers veilig en met zo min mogelijk hinder te kunnen uitvoeren is volgend verkeersplan opgesteld. Dit plan komt voort uit de belofte van het Projectplan om invulling te geven aan de verkeersmaatregelen door middel van een verkeersplan.

In de volgende paragraven is informatie opgenomen omtrent de soort uit te voeren werkzaamheden, de locaties, de tijdsduur en over de benodigde toe te passen verkeersmaatregelen. Dit plan is uitsluitend bedoeld voor het toestemming verkrijgen van de wegbeheerder en om de werkzaamheden op het gebied van verkeersveiligheid veilig te kunnen uitvoeren.

2. Locatie van de werkzaamheden en algemene gegevens

2.1 Algemeen

In dit verkeersplan wordt ingegaan op de maatregelen die getroffen moeten worden bij de baggerwerkzaamheden binnen de gemeente Westland. Deze werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- Het baggeren van watergangen
- Het reinigen van duikers
- Het verspreiden van baggerspecie
- Het afvoeren van vrijkomende baggerspecie

2.2 Locatie van de werkzaamheden

Het uit te voeren werk is aan de Grote Woerdlaan in de gemeente Westland.

2.3 Uitvoeringswijze

Duikers reinigen

Het duikers reinigen gebeurd met een rioleringswagen die is voorzien van het actieraam van figuur 2. En een F06 bord (figuur 3). Wij werken een korte tijd langs of op de weg en de werknemers die de duikers doorspuiten staan te allen tijde langs de weg of in de luwte van de auto. Deze werkwijze is volgens figuur 1221 van de CROW 96b.



Figuur 2.



Figuur 3.

Baggeren

De watergangen worden gebaggerd met een graafmachine. Wanneer de bagger niet bereikbaar is voor de graafmachine wordt de schuifboot ingezet. De schuifboot schuift namelijk de bagger in de watergang op naar locaties die bereikbaar zijn voor de graafmachine op de oever. Dit noemen wij de overslaglocaties. Op deze locaties schept de graafmachine de baggerspecie in vrachtwagens die het vervolgens afvoeren naar een verwerkingslocatie. De overslaglocaties staan op de tekeningen aangegeven met figuur 4. De overslaglocaties zullen zoveel mogelijk naast de weg worden ingericht, zodat weggebruikers minimaal hinder ondervinden.



Figuur 4.

2.4 Uitvoeringsgegevens

• Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:
1 september

• Geplande uitvoeringsduur:
4 weken

• Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de locatie aanwezig zal zijn:
3 werknemers

• Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:
1 werkgever

• Werktijden:
De werkzaamheden worden standaard uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur.

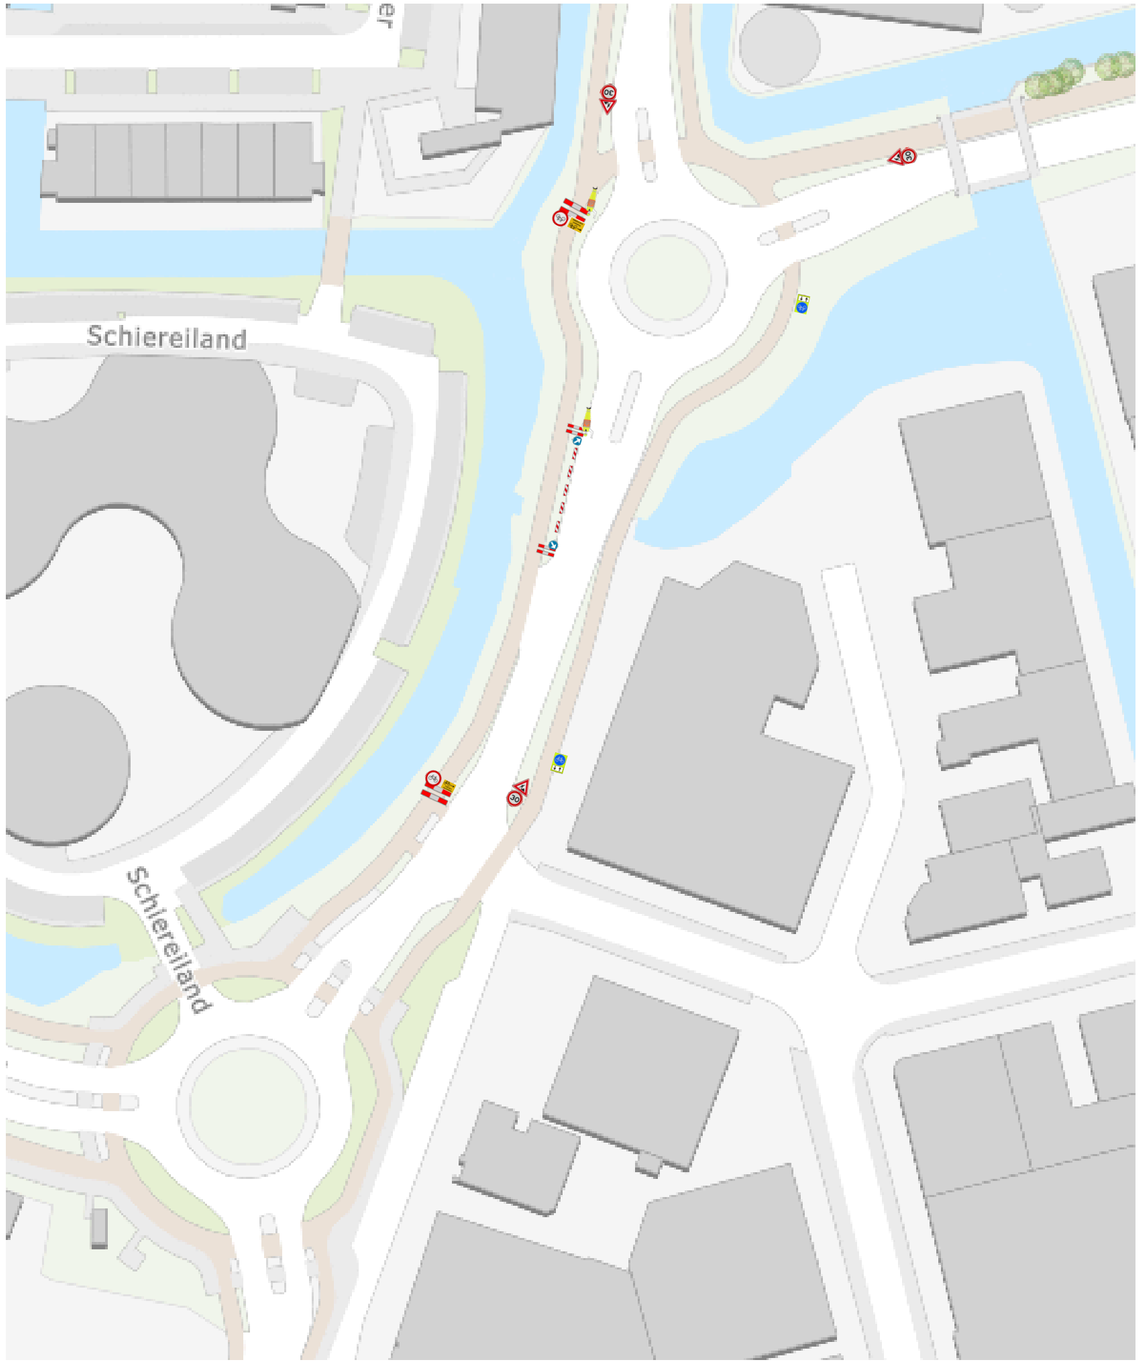
3. Verkeersmaatregelen gemeente Westland

3.1 Maatregel

Locatie	Grote Woerdlaan
Periode van uitvoering	1 t/m 30 september
Verkeersmaatregelen	Figuur 96b – 1205 / 1123a / 2 verkeersregelaars
wegbeheerder	Gemeente Westland
Uitvoering	
Baggermethode	Graafmachine, Schuifboot
Afvoer	Vrachtwagen, trekker met kipper
Voorzieningen	In de berm worden rijplaten toegepast.
Opmerkingen	

3.2 Tekeningen

Zie volgende pagina's


Schiereiland
Schiereiland


Narwal
Beloega
Butskop
Noordkaper
Bruinvis


Narwal
Beloega
Butskop
Noordkaper
Bruinvis






Berglust
Prinsenpark
P
