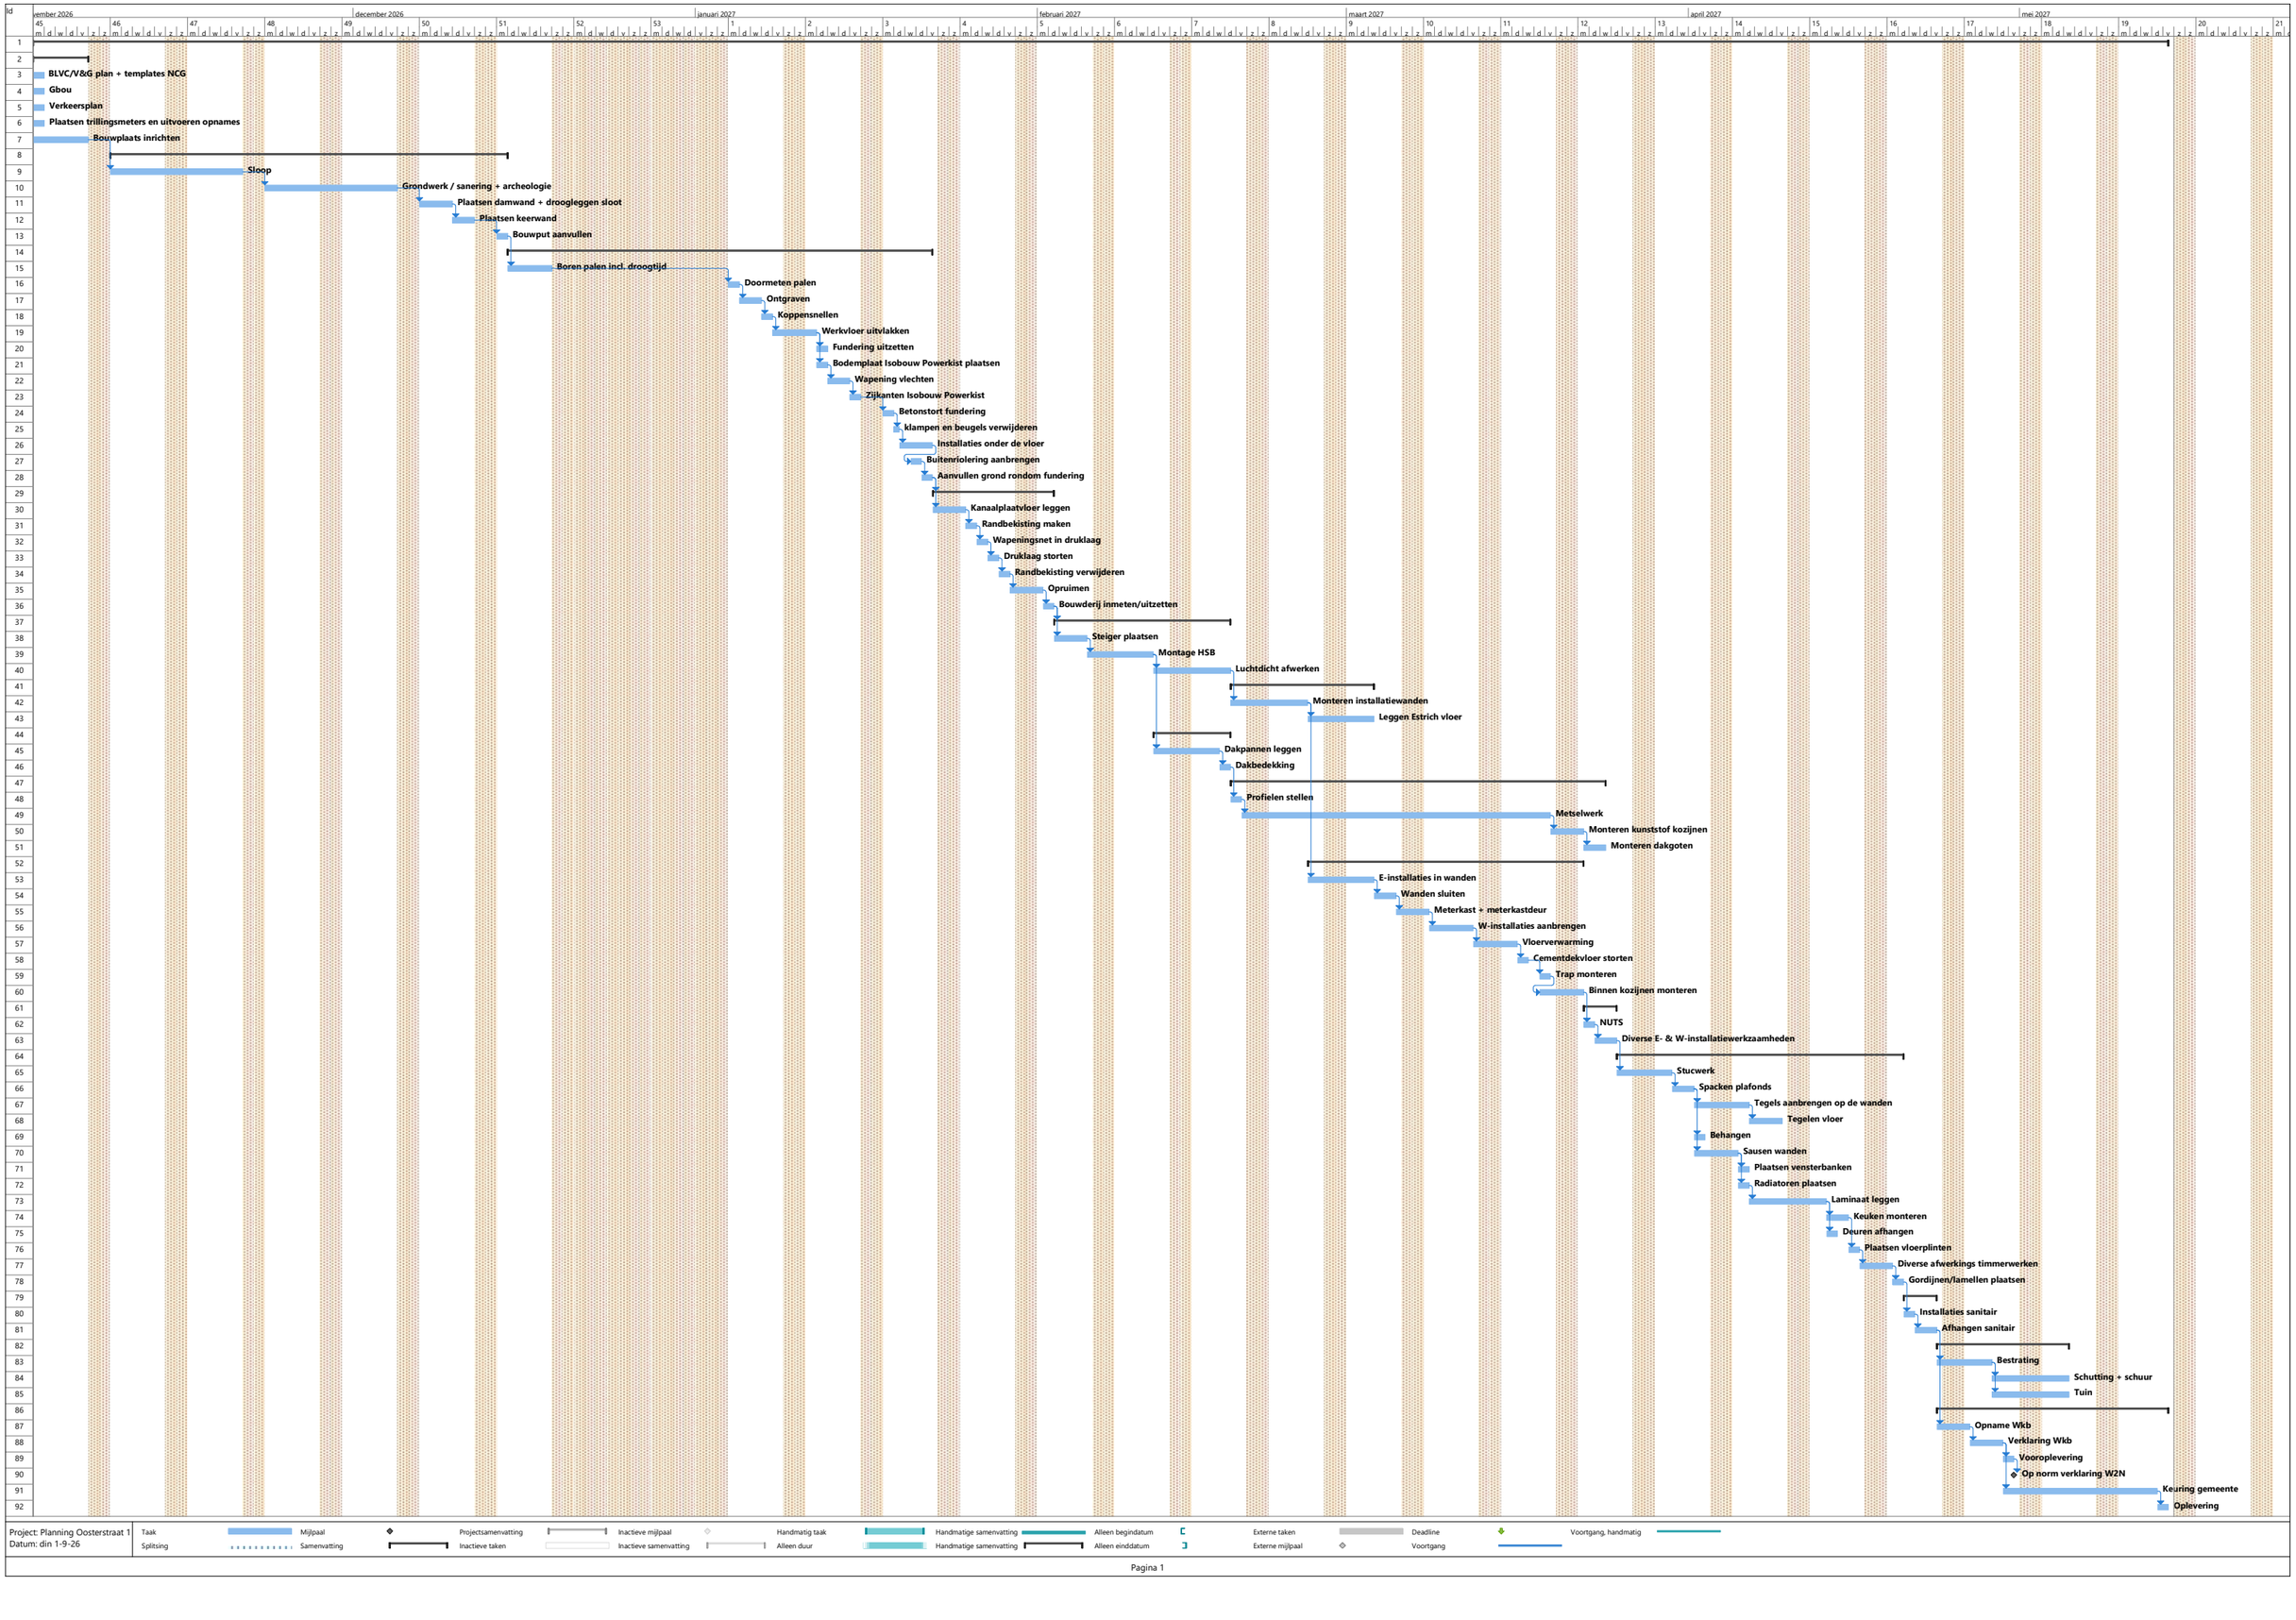

Id
vember 2026
december 2026
januari 2027
februari 2027
maart 2027
april 2027
mei 2027
BLVC/V&G plan + templates NCG
Gbou
Verkeersplan
Plaatsen trillingsmeters en uitvoeren opnames
Bouwplaats inrichten
Sloop
Grondwerk / sanering + archeologie
Plaatsen damwand + drooglegen sloot
Plaatsen keerwand
Bouwput aanvullen
Boren palen incl. droogtijd
Doormeten palen
Ontgraven
Koppensnellen
Werkvloer uitvlakken
Fundering uitzetten
Bodemplaat Isobouw Powerkist plaatsen
Wapening vlechten
Zijkanten Isobouw Powerkist
Betonstort fundering
klampen en beugels verwijderen
Installaties onder de vloer
Buitenriolering aanbrengen
Aanvullen grond rondom fundering
Kanaalplaatvloer leggen
Randbekisting maken
Wapeningsnet in druklaag
Druklaag storten
Randbekisting verwijderen
Opruimen
Bouwderij inmeten/uitzetten
Steiger plaatsen
Montage HSB
Luchtdicht afwerken
Monteren installatiewanden
Leggen Estrich vloer
Dakpannen leggen
Dakbedekking
Profielen stellen
Metselwerk
Monteren kunststof kozijnen
Monteren dakgoten
E-installaties in wanden
Wanden sluiten
Meterkast + meterkastdeur
W-installaties aanbrengen
Vloerverwarming
Cementdekvloer storten
Trap monteren
Binnen kozijnen monteren
NUTS
Diverse E- & W-installatiewerkzaamheden
Stucwerk
Spacken plafonds
Tegels aanbrengen op de wanden
Tegelen vloer
Behangen
Sausen wanden
Plaatsen vensterbanken
Radiatoren plaatsen
Laminaat leggen
Keuken monteren
Deuren afhangen
Plaatsen vloerplinten
Diverse afwerkings timmerwerken
Gordijnen/lamellen plaatsen
Installaties sanitair
Afhangen sanitair
Bestrating
Schutting + schuur
Tuin
Opname Wkb
Verklaring Wkb
Vooroplevering
Op norm verklaring W2N
Keuring gemeente
Oplevering
Project: Planning Oosterstraat 1
Datum: din 1-9-26
Taak
Splitsing
Mijlpaal
Samenvatting
Projectsamenvatting
Inactieve taken
Inactieve mijlpaal
Inactieve samenvatting
Handmatig taak
Alleen duur
Handmatige samenvatting
Handmatige samenvatting
Alleen begindatum
Alleen einddatum
Externe taken
Externe mijlpaal
Deadline
Voortgang
Voortgang, handmatig
